Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Vorgänger
1				
2				
3	**Sanierung Delme Dämme**			
4	**Brutzeit/Wochenstubenzeit**	**01 Mrz**	**30 Sep**	
9	**Hochwasserfreie Saison**	**15 Apr**	**15 Sep**	
14				
15	**Vorbereitende Maßnahmen (im Jahr vor Baubeginn des jeweiligen BA)**	**01 Jan**		
16	**Zeitraum Höhlen- und Quartierskontrolle**	**03 Jan**	**28 Feb**	
19	**Zeitraum Baufeldkontrolle Grünland und Röhricht**	**02 Mai**	**30 Jun**	
22	**Zeitraum ggfls. Bestandsbergungen/Saatgutgewinnung**	**01 Jul**	**28 Jul**	
25	**Zeitraum Installation Ersatzkästen/Quartierverschluss**	**01 Sep**	**29 Sep**	
28	Zeitraum Gehölzrodung für Umverlegung Gashochdruckleitung	03 Okt	28 Feb	
29	Umverlegung Gashochdruckleitung und Verdämmen alte Leitung durch SWD (einschl. Baufeldkontrolle und/oder Vergrämung in der Bauzeit) - Festlegung Ausführungszeitraum durch SWD	01 Mrz	31 Jul	28
30				
31	**1. Baujahr - Baustelleneinrichtung Sanierung linksseitig**	**02 Okt**	**21 Jun**	
32	ggfls. Aufstellen von Absperrgittern, Anbringen von Baumschutzmanschetten bei Baustraßen und BA links	02 Okt	31 Okt	
33	Ersatzpflanzungen	02 Okt	13 Okt	
34	Überfahrt Hoyers Graben / Baustellenzufahrt (Schotter auf Geotextil) herstellen - rechtsseitig einschl. Strauchrodung	02 Okt	13 Okt	
35	BE- und Lagerfläche BA 3 rechts herstellen	16 Okt	18 Okt	34
36	Gehölzrodung BA 3 rechts - neue Dammtrasse von BE-Fläche bis Behelfsbrücke	19 Okt	01 Nov	35
37	Baustraße BA 3 rechts herst. (Schotter auf Geotextil) - neue Dammtrasse von BE-Fläche bis Behelfsbrücke	02 Nov	15 Nov	36
38	Herstellung Behelfsbrücke über Delme	16 Nov	29 Nov	37
39	Baustraße BA 2+3 links herst. (Baggermatratzen auf vorh. Damm)	30 Nov	30 Nov	38
40	Gehölzrodung BA 1-3 links	01 Dez	21 Dez	39
41	BE-/Lagerfläche BA 1+3 links herstellen	21 Dez	22 Dez	
42	Gehölzrodung BA 4+5 links - neue Dammtrasse	02 Jan	29 Jan	41
43	Baustraße und BE-Fläche BA 4+5 links herst. - neue Dammtrasse	30 Jan	07 Feb	42
44	Rückbau Behelfsbrücke (nach Abschluss Vorgang 54)	18 Jun	21 Jun	54
45				
46	**1. Baujahr - Baumaßnahmen Sanierung linksseitig**	**02 Jan**	**28 Aug**	
47	Spundwand herstellen BA 2 einschl. Durchführung DN 800 zur Mili (Sondergenehmigung für Bau Durchführung in Hochwassersaison erf.!)	02 Jan	05 Feb	41
48	Spundwand herstellen BA 5	08 Feb	08 Feb	43
49	Zeitraum Baufeldkontrolle und/oder Vergrämung Brutvögel BA links (ab 01.03.)	01 Mrz	31 Jul	
50	Herstellung neuer Damm BA 4 + 5 (vor Kopf von Norden Ri. Süden) + DV-Weg auf Dammkrone	09 Feb	28 Aug	48
51	Dammertüchtigung BA 3 + DV-Weg auf Dammkrone	15 Apr	17 Mai	
52	Herstellung Überlaufschwelle Stat. 0+200 + Entleerungsbauwerk	20 Mai	31 Mai	51
53	Herstellung Stillgewässer	03 Jun	03 Jun	52
54	Herstellung Überlaufschwelle Stat. 0+600	04 Jun	17 Jun	53
55	Dammertüchtigung BA 1 + Notüberlauf + DV-Weg (Beschickung über "Am Delmegrund")	18 Jun	08 Jul	54
56				
57	**2. Baujahr - Baustelleneinrichtung Sanierung rechtsseitig**	**01 Okt**	**26 Jun**	
58	ggfls. Aufstellen von Absperrgittern, Anbringen von Baumschutzmanschetten bei Baustraßen und BA rechts	01 Okt	31 Okt	
59	Ersatzpflanzungen	01 Okt	14 Okt	
60	Gehölzrodung BA 3 - neue Dammtrasse Ri. Norden u. Süden	01 Okt	28 Okt	
61	Baustraße Abschnitt 3 fortführen + BE-Fläche - neue Dammtrasse rechtsseitig, Ri. Norden u. Ri Süden	15 Okt	23 Okt	60
62	Baustraße BA 2 + 4 mit Baggermatratzen herstellen (für Spundwandherstellung)	24 Okt	25 Okt	61
63	Gehölzrodung Abschnitt 5 neue Dammtrasse	29 Okt	04 Nov	60
64	Baustraße Abschnitt 5 neue Trasse	23 Mai	29 Mai	76
65	Überfahrt Hoyers Graben / Baustellenzufahrt / BE-Flächen zurückbauen- rechtsseitig (mit Abschluss Vorgang 75)	20 Jun	26 Jun	77
66				
67	**2. Baujahr -Baumaßnahmen Sanierung rechtsseitig**	**28 Okt**	**26 Jun**	
68	Wurzelbehandlung BA 4 rechts	28 Okt	05 Nov	
69	Spundwand herstellen BA 2	28 Okt	05 Nov	62
70	Spundwand herstellen BA 4	06 Nov	20 Dez	69
71	Zeitraum Baufeldkontrolle und/oder Vergrämung Brutvögel BA rechts (ab 01.03.)	01 Mrz	26 Jun	
72	Herstellung neuer Damm BA 3 + DV-Weg auf Dammkrone (ca. Stat. 1+090 bis 0+770)	02 Jan	26 Feb	
73	Herstellung neuer Damm BA 3 + DV-Weg auf Dammkrone (ca. Stat. 0+500 bis 0+770)	27 Feb	23 Apr	72
74	Herstellung Überlaufschwelle Stat. 0+650	24 Apr	07 Mai	73
75	Herstellung Stillgewässer	08 Mai	08 Mai	74
76	Herstellung Überlaufschwelle Stat. 1+050	09 Mai	22 Mai	75
77	Dammertüchtigung und neue Trasse BA 5 + DV-Weg auf Dammkrone	23 Mai	19 Jun	76

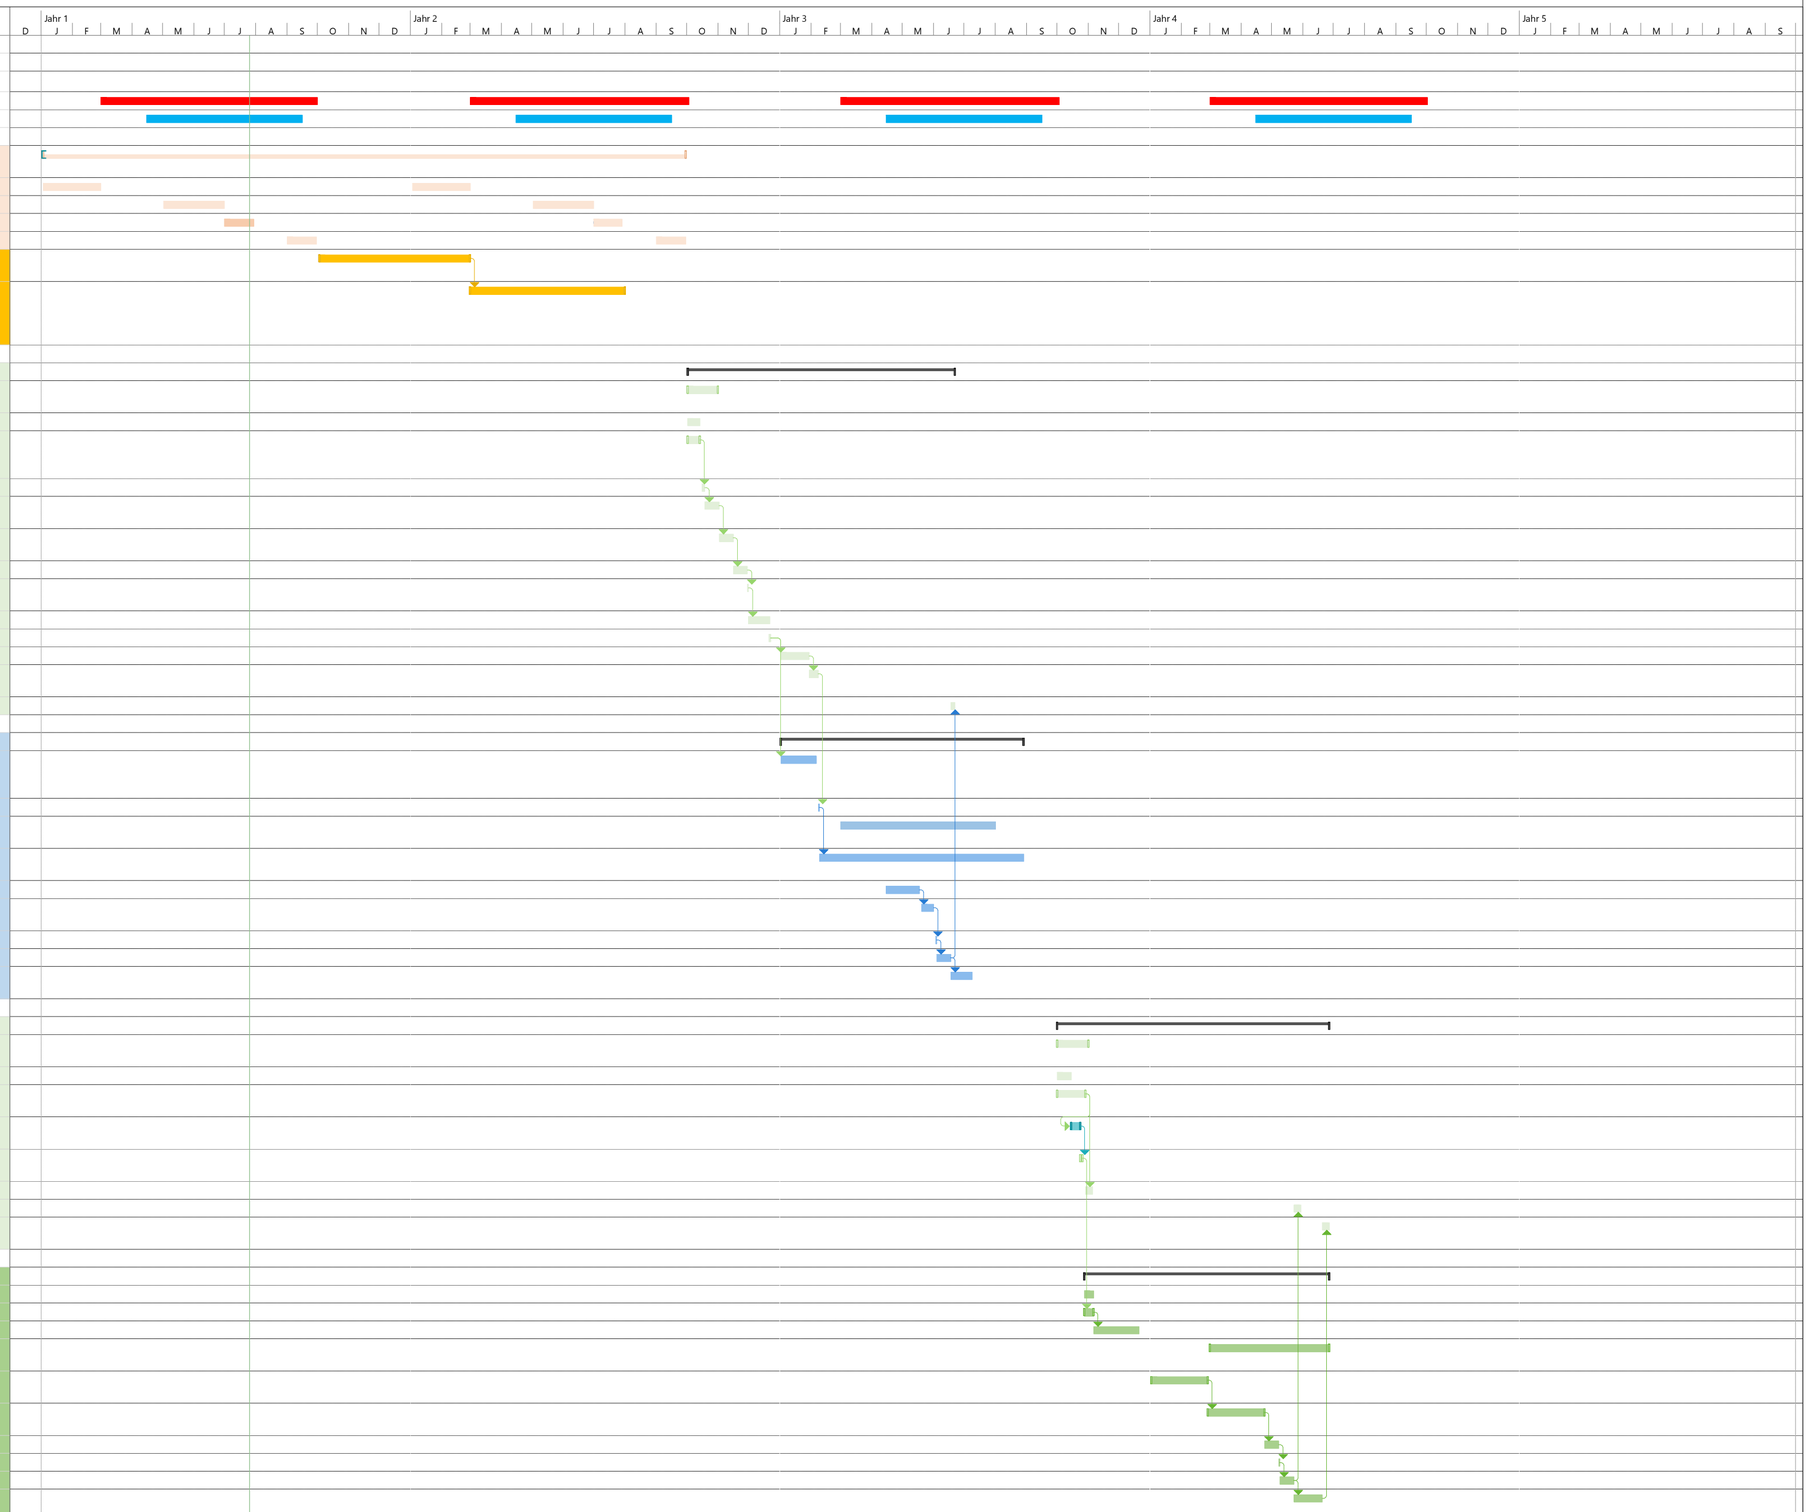

Projekt: 5352-A
Anlage: 11
Bauablaufplan

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
